

Travaux 2026

Métro et Tramway

CONFIDENTIEL



14 AVRIL 2026



Projets S1 2026



CONFIDENTIEL

Travaux du S1 2026

LIGNE	ENTITE PROJET	DEBUT	FIN	DETAIL
Ligne 3bis	CT Renouvellement poste signalisation en lien avec le PCC modernisé (OMF19)	16/05/26 sam.	20/05/26 mer.	ITC de 5 jours entre Porte des Lilas et Gambetta
Ligne 3	OMF19 Rénovation patrimoniale / dépose carrelage à Gallieni	08/04/26 mer.	12/05/26 mar.	ITC de 35j entre Gallieni et Gambetta
Ligne 4	VOIE Renouvellement d'Appareils de Voie 429 + 423/424	20/04/26 lun.	01/05/26 ven.	ITC de 12 jours entre Barbes et Chatelet
Ligne 7bis	VOIE RAV 508 + 510 + 519/521 + Reprofilage de la voie pour l'arrivée du MF19	21/02/26 sam.	08/03/26 dim.	ITC de 16 jours entre Louis Blanc et Pré St Gervais
Ligne 12	OMF19 Installation d'équipements OCTYS	janv-26	août-26	NL sur la période (2 à 3 par semaine en janvier / février / mars / juin et 1 par semaine sur avril / mai / juillet / aout)
Ligne 12	OMF19 Installation d'équipements OCTYS	31/05/26 dim.	31/05/26 dim.	ITC de 1 jour entre Porte de Versailles et Mairie d'Issy
Ligne 13	OMF19 Automatisation - Fermeture de stations non déjà équipées de FQ pour le rehaussement des quais	09/04/26 jeu.	12/04/26 dim.	Non desserte de la station Plaisance pendant 4 jours
Ligne 13	OMF19 Automatisation - Interventions sur quais pour les essais du MF19	28/02/26 sam.	01/03/26 dim.	ITC de 2 jours entre Asnières Genevilliers Les Courtilles et La Fourche
Ligne 13	OMF19 Automatisation - Rescindements de quais pour les essais MF19	15/03/26 dim.	29/03/26 dim.	2 dimanches matin avec coupure jusqu'à 12h sur ligne entière
Ligne 13	OMF19 Modernisation - Essais systèmes pour la mise en service du MF19	03/05/26 dim.	28/06/26 dim.	2 dimanches matin avec coupure jusqu'à 12h sur ligne entière
Ligne 14	PL14 EXTENSION DU SAET à Orly et Pleyel : Version post-MeS étape 4 (si nécessaire)	08/02/26 dim.	08/02/26 dim.	1 dimanche matin jusqu'à 14h sur ligne entière
Ligne 14	PL14 EXTENSION DU SAET à Orly et Pleyel : Version post-MeS étape 4 (si nécessaire)	18/03/26 dim.	20/03/26 dim.	2 NL sur ligne entière
Ligne 14	PL14 EXTENSION DU SAET à Orly et Pleyel : Version post-MeS étape 4 (si nécessaire)	05/04/26 dim.	05/04/26 dim.	1 dimanche matin jusqu'à 10h sur ligne entière
T2	ACE Réaménagement du terminus Porte de Versailles	03/03/25 lun.	20/02/26 ven.	ITC du 03/03/25 au 20/02/26 entre les stations Suzanne Lenglen et Porte de Versailles

Renouvellement des postes de Signalisation L3B





Objectifs du projet

- Renouvellement patrimonial postes de signalisation (technologie en voie d'obsolescence : évolutivité limitée, stock de rechange limité et coût de maintenance élevé)



Nature des travaux

- Installation de 2 postes de technologie PHPI
- Mise en place d'une commande informatisée au poste de manœuvre
- Nouvelle version PCC, intégrant les évolutions pour MF19

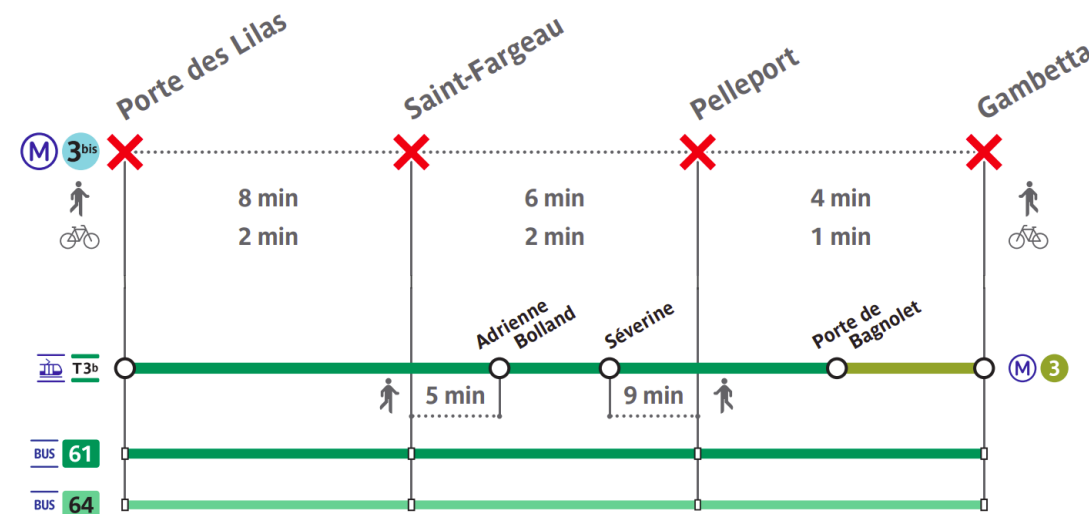

Dates et impacts

- Nuits longues ligne entière (Porte des Lilas à Gambetta) les dimanches 12, 19 et 26 avril, 3 et 10 mai, à partir de 22h
- ITC Ligne entière du 16 au 22 mai inclus

Dépose de carrelage à Gallieni

Objectifs du projet

- Renouvellement patrimonial : travaux de rénovation de la station avec dépose du carrelage existant au niveau des quais


→ Plan de Transport :

Nature des travaux

- Dépose de carrelage sur le piédroit, les tympans au dessus des voies, à l'avant et à l'arrière des quais

Dates et impacts

- Coupure entre Gambetta et Gallieni, avec bus de substitution
- ITC Ligne entière du 08 avril au 12 mai inclus

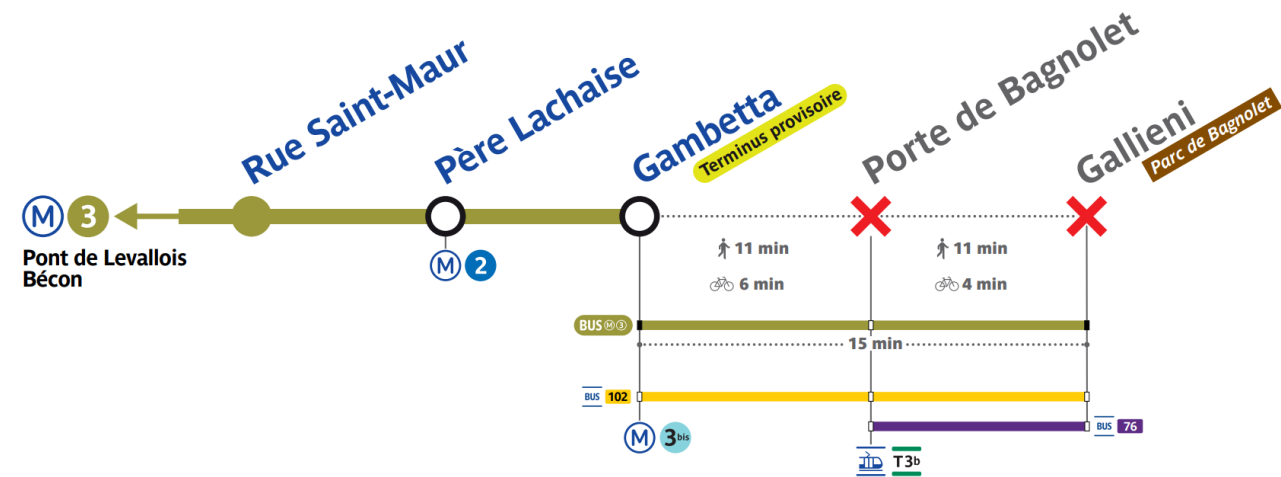

Renouvellement de 3 ADV à Etienne Marcel et à Réaumur Sébastopol



Objectifs du projet



→ Renouvellement patrimonial des voies de la ligne 4

→ Plan de Transport :



Nature des travaux

- Renouvellement de l'appareil de voie n°429 à Etienne Marcel
- Renouvellement des appareils de voie n°423 et 424 à Réaumur Sébastopol

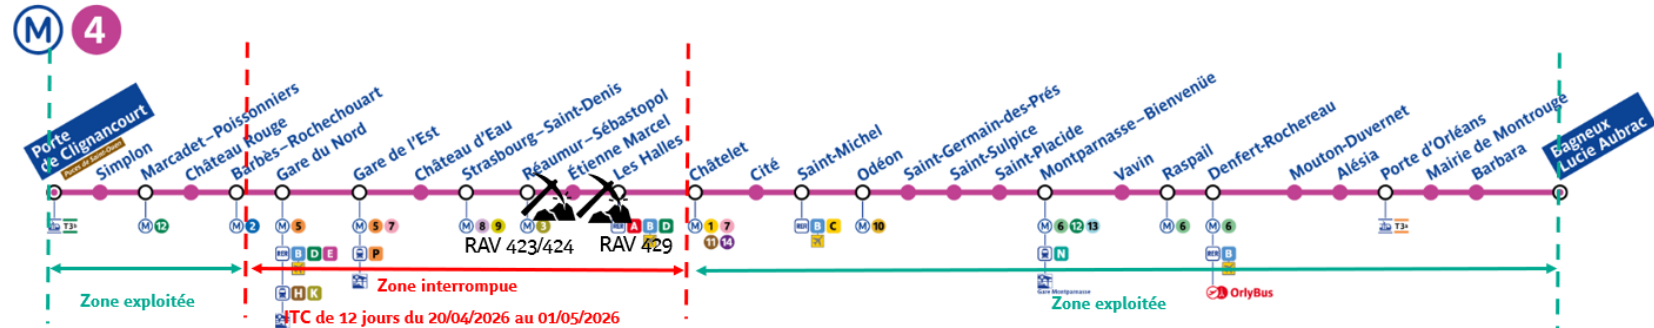

Dates et impacts

- ITC entre Barbès Rochechouart et Châtelet
- 12 jours d'ITC du 20/04/2026 au 01/05/2026
- 3 jours de stabilisation sous LTV du 02/05/2026 au 04/05/2026. LTV à 15km/h entre Etienne Marcel et Réaumur Sébastopol du 02/05/2026 au 04/05/2026

ITC : Interruption Temporaire de Circulation
NL : Nuit Longue
RAV : Renouvellement d'Appareil de Voie
RR : Renouvellement de Rail

Renouvellement de 4 ADV à Place des Fêtes et à Près Saint-Gervais + travaux de massification




Objectifs du projet

→ Renouvellement patrimonial des voies sur la Ligne 7 Bis



Nature des travaux


- Renouvellement des appareils de voie n°519 et 521 à Pré-Saint-Gervais
- Renouvellement des appareils de voie n°510 et 508 à Place des Fêtes
- Renouvellement de traverses et du ballast sur le quai 2 de Bolivar
- Renouvellement de 487 ml de rails
- Meulage des rails par train spécial (SPENO) sur l'ensemble de la ligne 7bis



Dates et impacts

- ITC chantier avec interruption totale du trafic voyageurs sur l'ensemble de la ligne 7bis.
- 16 jours d'ITC du 21/02/2026 au 08/03/2026
- 3 jours de stabilisation sous LTV du 09/03/2026 au 11/03/2026. LTV à 15km/h entre Place des Fêtes et Près Saint-Gervais

→ Plan de Transport :

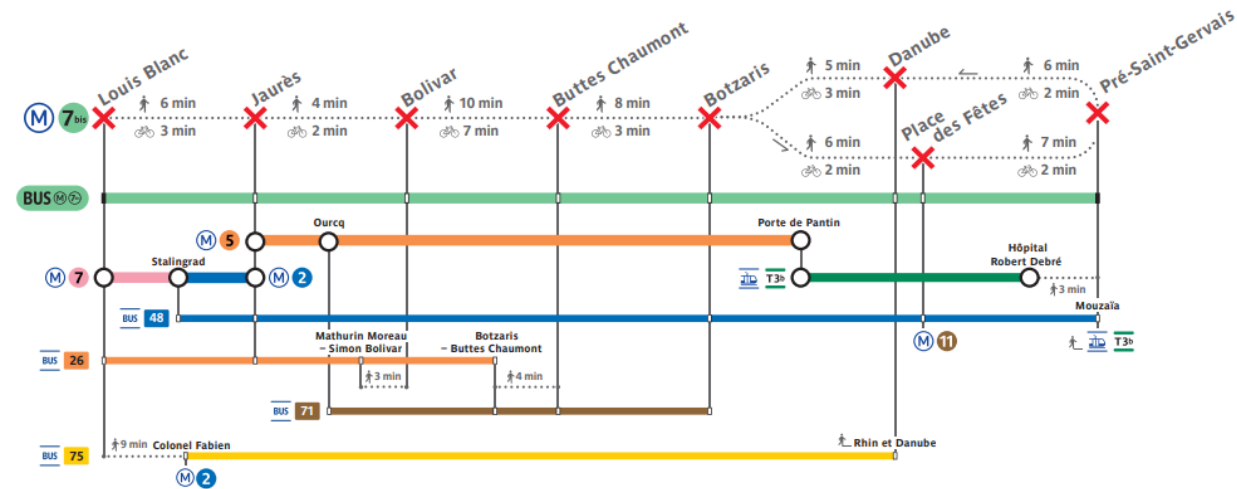

Installation des antennes pour la radio OCTYS



Objectifs du projet


- Installation des antennes pour la radio OCTYS :
 - Raccorder les antennes radio au système central
 - Préparer les essais de communication train/antennes



Nature des travaux


- Installation des antennes au niveau de la voute du tunnel sur toute la ligne
- Raccordement des antennes aux boîtiers de raccordement

→ Plan de Transport



Dates et impacts

- 50 NL sur ligne entière
- NL du 04/01/26 au 30/08/26
- Fermeture de la ligne à 22H30 (derniers départs des terminus à 22h)

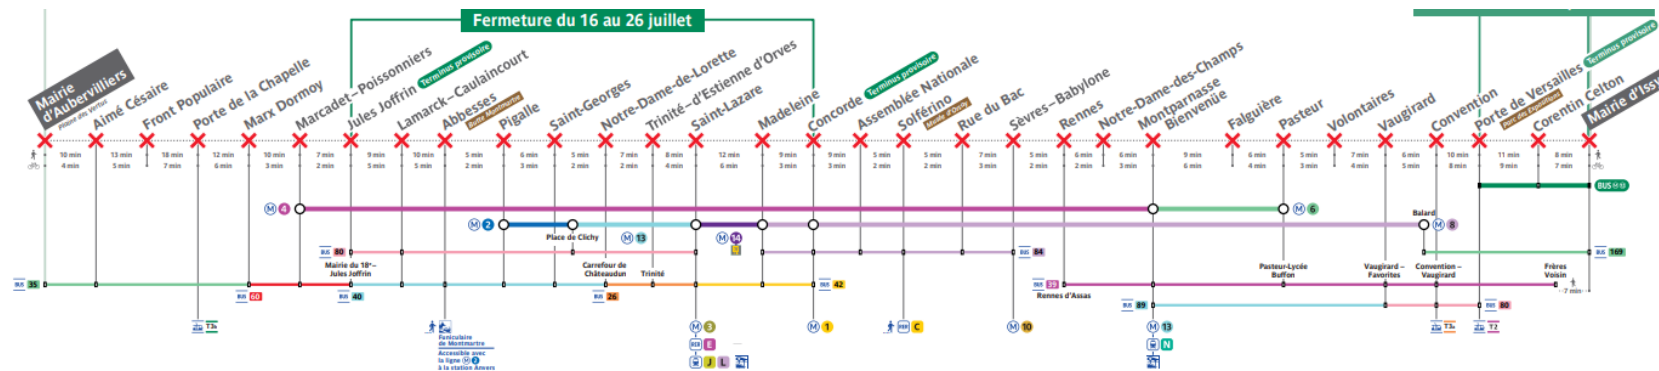

Automatisation – Fermeture de stations non déjà équipées de FQ pour le rehaussement des quais



Objectifs du projet

→ Automatisation de la ligne 13



Nature des travaux

→ Rehaussement des quais de la station (préalablement à l'installation ultérieure des façades de quai)



Dates et impacts

- 5 stations non desservies :
- Plaisance : du 09 au 12/04/2026 (4 jours)
 - Porte de Vanves : du 06 au 09/08/2026 (4 jours)
 - Porte de St-Ouen : du 24 au 27/09/2026 (4 jours)
 - Porte de Clichy : du 29/10 au 01/11/2026 (4 jours)
 - Mairie de St-Ouen : du 26 au 29/11/2026 (4 jours)

→ Plan de Transport (pour la 1^{ère} station de 2026) :



Pour plus d'infos : ratp.fr



Plaisance

Fermeture de la station du 9 au 12 avril 2026 inclus

Les trains ne marquent pas l'arrêt.
Nous vous remercions de bien vouloir adapter vos trajets.



Debit eos pedis debis denimai onsequid minusamus qui denihil iquistium ex expelles volorb erumquae quo magnit ella ellaboratum verunt deruptin eius.

Ebitaquunt, ne peles nos incte conet, nused quunt ium aut quos magni ut quas ma venda quation eius quaspedisit qui ilignim ilitiunt exeriatunt adiate que pratuste



ratp.fr

34 24



Modernisation – Essais systèmes pour la mise en service du MF19

ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES AU FUTUR MATÉRIEL ROULANT MF19



Calendrier des fermetures les dimanches matin jusqu'à 12h

Pour plus d'infos : ratp.fr




BUS M13

Un bus de remplacement est mis en place entre les stations Asnières – Gennevilliers Les Courtilles et Porte de Cligny.

Mal	Juin	Juillet	Août
L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

→ Plan de Transport :



parcloe vit ene quas esed quam, nonseidia sa pre voloes nex fuglia voloria dolupram vid est fugliaem es et, seque laborrov id undam Ipte, se eosamus apientis recas, voloesumo ammod que non conecco consequoziam enecor eserla nonserf eribusam aux aux perspeli magnien Ihicipi endam elliquaene labor aur sit ut ommissu sapien volentur, ut quazis idit volorum




Objectifs du projet

→ Modernisation de la ligne 13 pour l'arrivée du MF19. Mise en service de ce nouveau métro prévue mi-2027.



Nature des travaux

→ Circulation de trains d'essais MF19 sur la ligne pour tester les équipements systèmes embarqués dans les trains et sur la ligne : système de conduite, information voyageurs, vidéoprotection, etc.



Dates et impacts

→ ITC dimanches matin (de samedi FDS à dimanche 12h), environ 2 par mois :
15/03/2026 (reprise à 10h) ; 29/03/26 ; 03/05/2026 ; 17/05/2026 ; 07/06/2026 ; 28/06/2026 ; 02/08/2026 ; 16/08/2026 ; 30/08/2026 ; 13/09/2026 ; 20/09/2026 ; 27/09/2026 ; 11/10/2026 ; 01/11/2026 ; 15/11/2026 ; 29/11/2026 ; 13/12/2026

Mise en service des prolongements et du nouveau système de pilotage automatique des trains

Objectifs du projet 2026

→ Mise en service des derniers correctifs d'ergonomie du système de pilotage automatique


→ Plan de Transport Adapté mis à niveau

Nature des travaux

→ Essais de la dernière versions successives

Dates et impacts : ITC ligne entière

- Dimanche 8 février 2026 jusqu'à 14h
- 2 nuits longues (fin de service à 22h) les 18 et 26/03/2026
- Dimanche 5 avril 2026 jusqu'à 14h

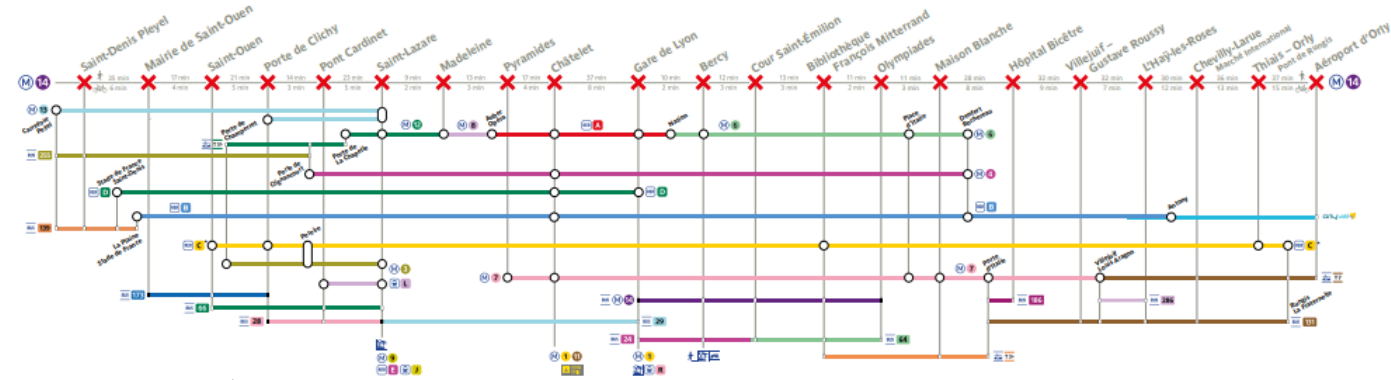

Calendrier des fermetures 2026

Mars							Avril						
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
						1			1	2	3	4	5
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			
30	31												

■ Fermeture complète de la ligne à partir de 22h

■ Fermeture complète de la ligne jusqu'à 14h

ITC pour la reprise du terminus de Porte de Versailles




Objectifs du projet

→ Dans le cadre du projet T2 ACE (amélioration des conditions d'exploitation), le terminus de Porte de Versailles est transformé pour permettre des manœuvres en arrière-gare, afin d'améliorer l'exploitabilité de la ligne




Nature des travaux

- Démolition et reconstruction de la plateforme et du terminus sur l'avenue Ernest Renan
 - Réduction de l'emprise en passant d'une station à quai central à une station à quais latéraux
 - Déplacement du terminus
 - Végétalisation de la plateforme



Dates et impacts

- ITC d'un an, de mars 2025 à février 2026
- Terminus provisoire à Suzanne Lenglen
- Terminus ponctuellement à Issy Val de Seine deux fois 2 semaines en Mars 2025 et T4 2025 avec mise en place de bus de substitution pour le terminus Issy Val de Seine

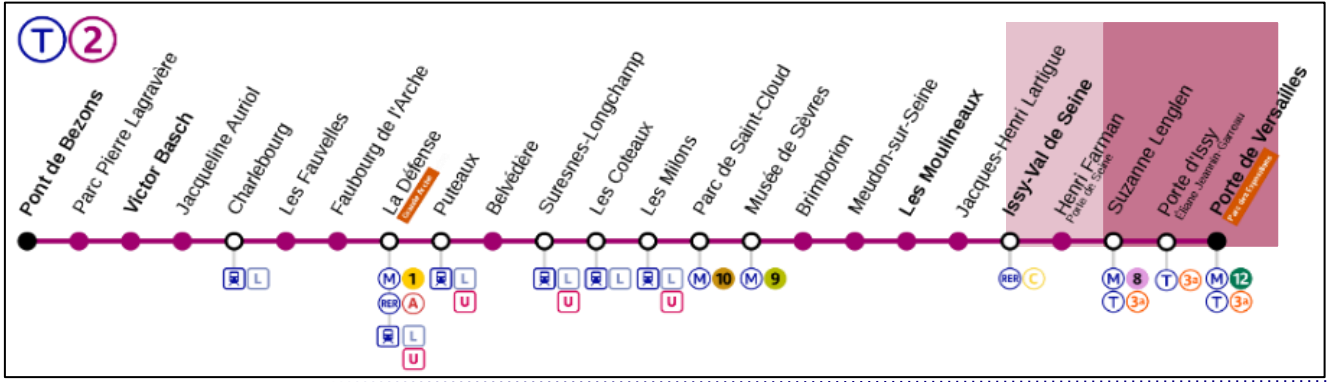



14 AVRIL 2026



Projets Eté 2026

CONFIDENTIEL



Travaux de l'été 2026

LIGNE	ENTITE	PROJET	DEBUT	FIN	DETAIL
Ligne 4	OIT	Enduit à St Placide, St Sulpice, Odéon et de part et d'autre de Saint Michel	06/07/26 lun.	24/07/26 ven.	ITC massifiée de 19 jours entre Les Halles et Montparnasse
Ligne 8	OMF19	Travaux de mise au gabarit pour le MF19	20/08/26 jeu.	27/08/26 jeu.	ITC de 8 jours entre Balard et Concorde
Ligne 8	Espaces	Rénovation des quais et des couloirs de circulation voyageurs	22/07/26 mer.	22/04/27 jeu.	Effacement du point d'arrêt ligne 8 pour la station République
Ligne 12	OMF19	Travaux de modernisation du SP de Trinité dont plan de voie et signalisation de nouveaux itinéraires	16/07/26 jeu.	26/07/26 dim.	ITC de 11 jours entre Jules Joffrin et Concorde
Ligne 13	OMF19	Automatisation - Fermeture de stations non déjà équipées de FQ pour le rehaussement des quais	06/08/26 jeu.	09/08/26 dim.	Non desserte de la station Porte de Vanves pendant 4 jours
Ligne 13	VOIE	Renouvellement d'Appareils de Voie 1940 + 1949 + 1941/1942	31/07/26 ven.	17/08/26 lun.	ITC de 18 jours entre Saint Denis Université et la Fourche
Ligne 13	Espace	Rénovation escalier mécanique Q1/Q3 et escalier fixe Q2	06/07/26 lun.	26/07/26 dim.	ITE 3 semaines Chatillon – coupure ITC entre Chatillon Montrouge et Malakoff Etienne Dolet
T1	SGP	Accompagnement des travaux de création de la boîte gare souterraine SGP L15E Pont de Bondy sous les infrastructures du T1	01/06/26 lun.	31/08/26 lun.	ITC de 3 mois été 2026 pour travaux de la SGP entre les stations Bobigny Pablo Picasso et Noisy le Sec
T1	SGP	Courneuve 6 routes (C6R) Modification du tramway T1 pour l'arrivée de la ligne 15 et Travaux de RR	13/07/26 lun.	28/08/26 ven.	Interruption de la ligne T1 entre La Courneuve 8 mai 45 et Gare de St Denis
T1	Externe	Interruption de trafic Ile St Denis pour réfection du pont	En cours	Été 2026	Fermeture du tronçon pour réfection du pont de l'île St Denis. entre Asnières 4 routes et Gare de St Denis
T2	Espace	Désaturation quai La Défense	13/07/26 lun.	23/08/26 ven.	ITC de 6 semaines entre Puteaux et Charlebourg

Enduits interstation Saint-Sulpice / Saint-Placide




Objectifs du projet

- Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de gros entretiens des ouvrages d'art du Métro
- Remplacement des vieux enduits en voûte (fissures, faïençage, infiltrations...)



Nature des travaux


- Réfection des enduits sur l'interstation de 390 ml (3 300 m², en voûte et uniquement au-dessus des chemins de câbles)
- Mise en provisoire préalable antennes GSM, déplacement des traversées de câbles, dépose équipements de signalisation...
- Protection des voies pendant travaux.



Dates et impacts

- Dates de l'ITC du lundi 06 juillet au vendredi 24 juillet 2026
- ITC L04 Les Halles / Montparnasse

→ Plan de Transport

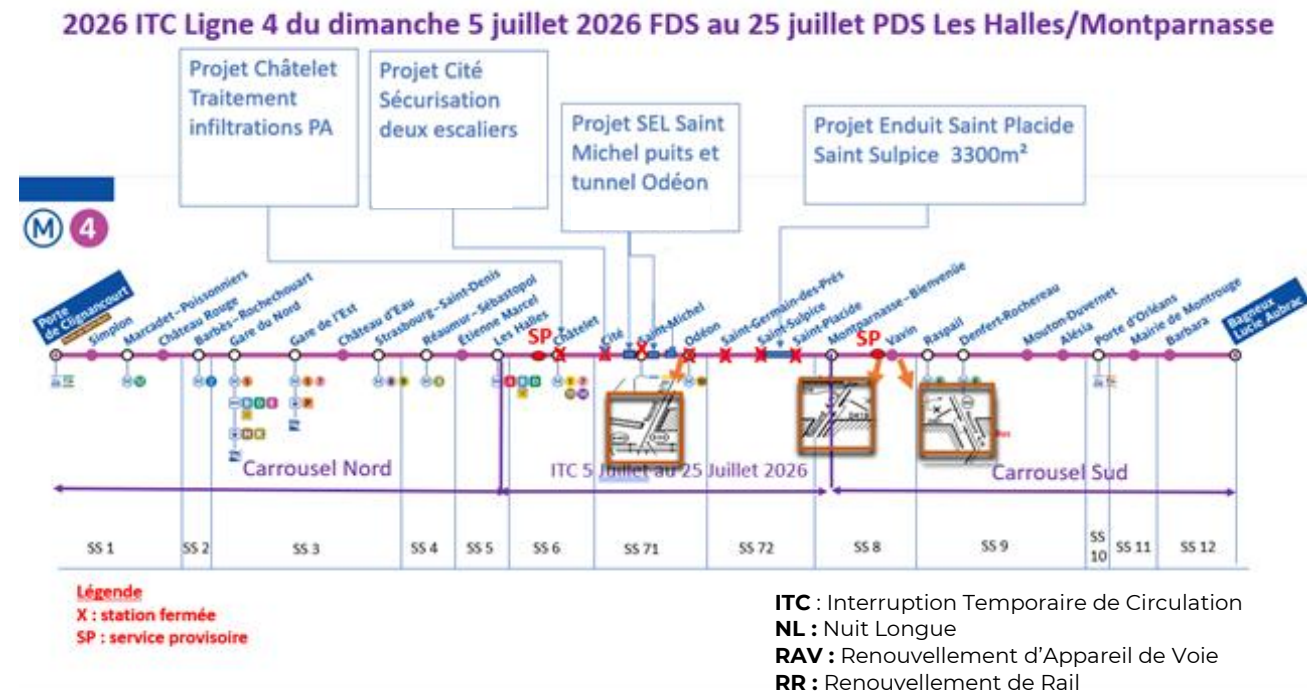

L04 Station Saint-Michel – Traitement des caissons direction Cité et direction Odéon

LIGNE 4




Objectifs du projet

- Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de gros entretiens des ouvrages d'art du Métro
- Traitement patrimonial des caissons métalliques des puits d'accès aux quais (notamment corrosion) et des points d'infiltration (nombreuses venues d'eau pendant les crues impactant l'exploitation, nombreuses infiltrations et corrosion sur les profilés et tôles métalliques)

→ Plan de Transport

2026 ITC Ligne 4 du dimanche 5 juillet 2026 FDS au 25 juillet PDS Les Halles/Montparnasse

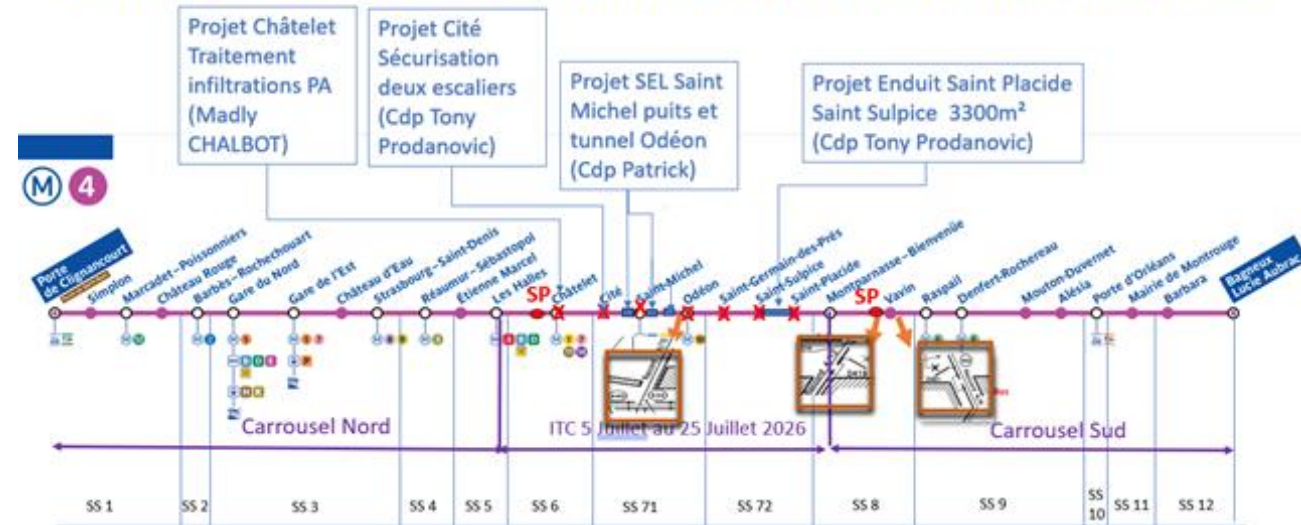

Légende
X : station fermée
SP : service provisoire

ITC : Interruption Temporaire de Circulation
NL : Nuit Longue
RAV : Renouvellement d'Appareil de Voie
RR : Renouvellement de Rail


Nature des travaux

- Travaux de réfection des caissons est et ouest de la station Saint-Michel sur la ligne 04:
- Remplacement d'escaliers métalliques
- Enduits et peintures, réfection des évacuations d'eau...
- Réfection des enduits sur les 2 amorces de tunnel (caissons métalliques) de chaque côté de la station (sur environ 15ml).

Dates et impacts

- Même ITC que les enduits L04 du 06 juillet au 24 juillet 2026

Travaux de mise au gabarit MF19

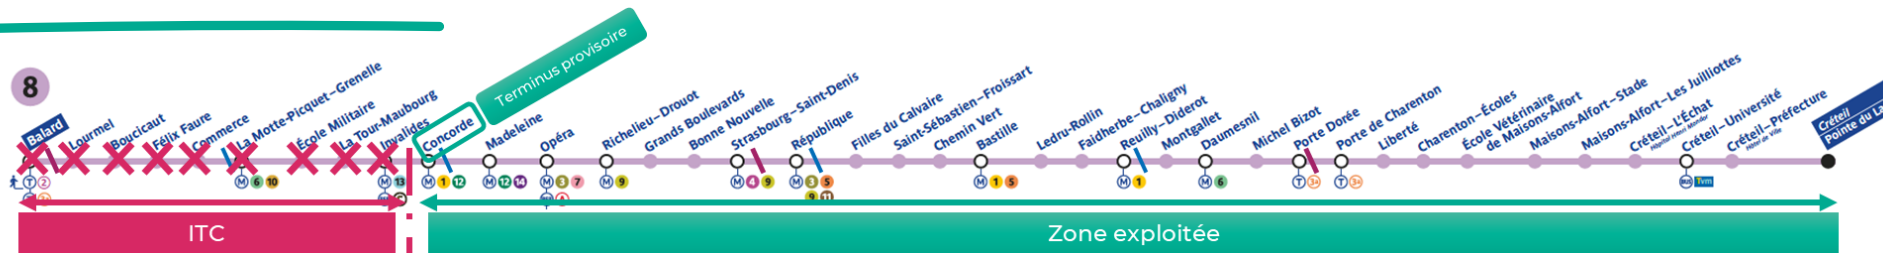


Objectifs du projet

→ **Travaux Voie** pour les besoins de **mise au gabarit** et optimisation du polygone de vitesse en prévision de l'arrivée du **MF19**



Nature des travaux

- Travaux **Voie** avec la **BML** (burrage, ripage et reprise de dévers)
- Avec une **massification** pour la réalisation d'autres travaux MF19-L8 :
 - Travaux de **Rescindement** de quais pour mise au gabarit
 - Travaux de **Modification de la Voie 3 de Lourmel** en préparation des travaux ERP de création d'un accès supplémentaire
 - Travaux de **Traction** dans l'arrière-gare de Balard
 - Travaux de **Signalisation** pour la prédisposition des installations
 - Travaux **Fibre Optique** de déroulage de câbles en tunnel
 - Travaux **Canal** de renouvellement des chemins de câbles en tunnel
 - Piquetage **OCTYS** pour les installations balises et radio



Dates et impacts

- ITC entre **Balard** et **Concorde**
- **8 jours** d'ITC du 20/08/26 au 27/08/26



Plan de Transport Adapté :

Report des flux sur les lignes 1, 6, 10, 12, 13 et T3A.

Renfort d'offre sur M12 en cours d'étude.

En plus des lignes régulières, mise en place d'un service de substitution Bus entre Balard et Concorde.

Données confidentielles

Rénovation des quais et des couloirs de circulation voyageurs




Objectifs du projet

- Rénovation de la station avec mise à niveau des systèmes et amélioration de la qualité d'ambiance des espaces
- Traitement des infiltrations afin de maintenir de manière pérenne les espaces à un niveau satisfaisant pour les voyageurs
- Désaturation de la station par les quais et les principaux couloirs de correspondance



Nature des travaux

- Travaux pour les infiltrations et la rénovation **sur les quais, en salle d'accueil, dans les couloirs et locaux exploitants**
- Travaux sur la désaturation aux niveaux -1 (SA200) et -2 (couloirs principalement)



Dates et impacts

- Effacement du Point d'Arrêt d'Exploitation de la ligne 8
- Du 22 juillet 2026 au 22 avril 2027

République

Fermeture de la station du 22 juillet 2026 au 22 avril 2027 inclus
Les trains ne marquent pas l'arrêt.

Nous vous remercions de bien vouloir adapter vos trajets.



Modernisation du Service Provisoire de Trinité d'Estienne d'Orves




Objectifs du projet

- Modernisation du SP de Trinité :
 - Apporter de la souplesse à l'exploitation de la ligne
 - Permettre de faire un retournement des trains depuis le nord comme depuis le sud de la ligne



Nature des travaux


- Dépose de 80ml de voie et de ballaste
- Pose d'un aiguillage
- Pose d'un tapis anti vibratile sous le ballaste
- Renouvellement du poste de signalisation
- Reprise de l'alimentation traction



Dates et impacts


- 11 jours d'Interruption Temporaire de Circulation
- Du 16 juillet au 26 juillet
- Fermeture de la ligne entre Concorde et Jules Joffrin

→ Plan de Transport

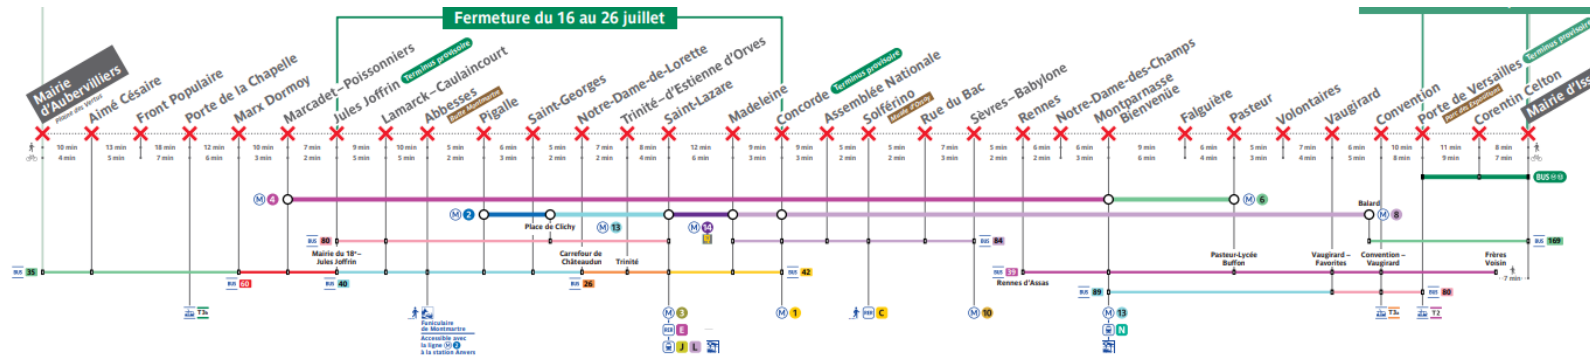

Renouvellement de 4 ADV à Carrefour Pleyel + travaux de massification

❑ Schéma zone interrompue : La Fourche - Saint Denis Université

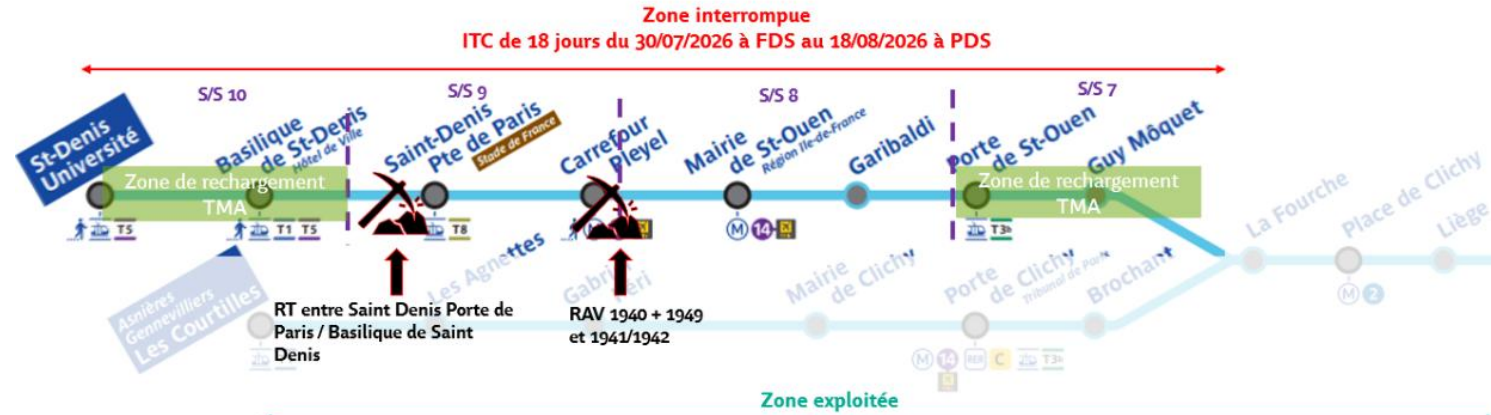


Objectifs du projet

→ Renouvellement patrimonial des voies de la ligne 13



Nature des travaux

- Renouvellement des appareils de voie n°1940, 1941, 1942 et 1949 à Carrefour Pleyel
- Renouvellement de traverses sur 195 ml à Saint Denis Porte de Paris



Dates et impacts

- ITC entre St-Denis Université et La Fourche
- 18 jours d'ITC du 31/07/2026 au 17/08/2026
- AMT de Pleyel non exploitable durant l'ITC
- 3 jours de stabilisation sous LTV du 18/08/2026 au 20/08/2026. LTV à 15km/h à Carrefour Pleyel

Spécificités :

La voie ballastée de Carrefour Pleyel a été injectée avec du coulis de ciment lors du passage des tunneliers des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris. Le système de drainage n'est plus fonctionnel et la zone est inondée en permanence

Remplacement des escaliers métalliques provisoires EF031 et EF032 – Châtillon Montrouge




Objectifs du projet

- Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de gros entretiens des ouvrages d'art du Métro,
- Pérennisation de 2 escaliers (2 volées, EF031 et 032) existants provisoires,
 - ❖ Appuis et fixations en mauvais état nécessitant une intervention à court terme,
 - ❖ Corrosion et foisonnement de la majorité des éléments structurels : marches, contremarches, limons, corbeaux, boulons de fixation dans le béton armé...




Nature des travaux

- Remplacement des 2 volées métalliques existantes par un escalier fixe en béton armé
- Comblement de la sous-face de l'ouvrage ;
- Traitement et gestion des eaux (création de rigoles + raccordement caniveau existant)
- Finitions: reprise carrelage et asphalte...

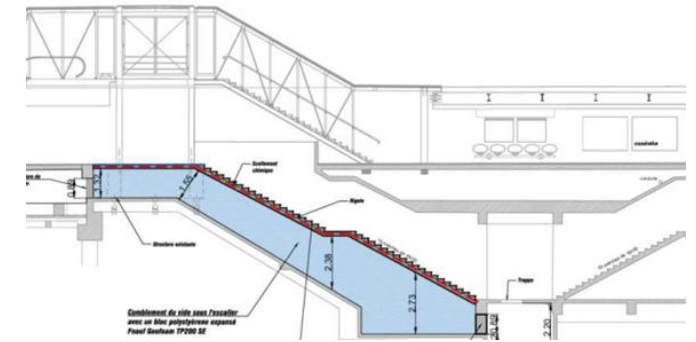

Dates et impacts

- Dates de l'ITE : **du 6 juillet au 26 juillet 2026**, à la station Châtillon-Montrouge
- Mutualisation avec maintenance patrimoniale de l'EM A.

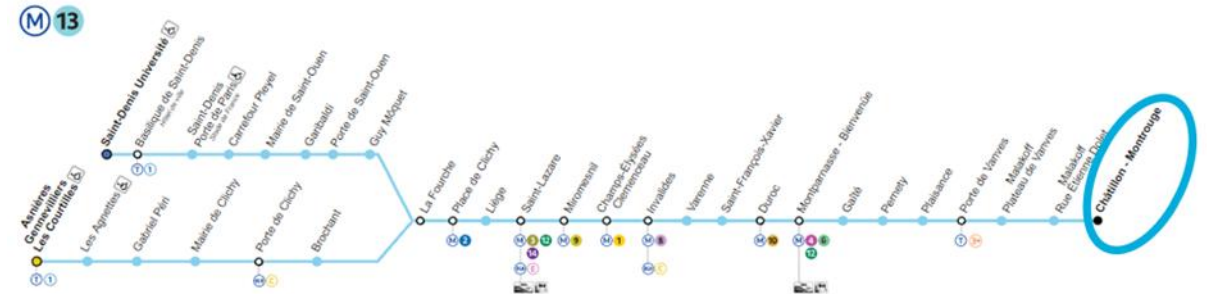



ITC pour les travaux Pôle Pont de Bondy



Objectifs du projet

- Travaux liés au pôle GPEX du Pont de Bondy
- Massification des travaux avec le programme de renouvellement de rail




Nature des travaux

- Pôle M15
 - Élargissement du quai en correspondance avec M15
 - Aménagement du poste de redressement
 - Création de traversées piétonnes
- Maintenance : démolition et reconstruction de la plateforme de voie
 - 250 mètres linéaires de plateforme de voie
 - 2 carrefours routiers
 - + de 5100 m2 de revêtement




Dates et impacts

- ITC de 3 mois, du 1er juin au 31 août 2026
- Travaux de maintenance : 4 semaines pendant ITC pôle
- Itinéraire bus envisagé devrait correspondre à celui lors de l'ITC BPP (T4 24 – T2 25)

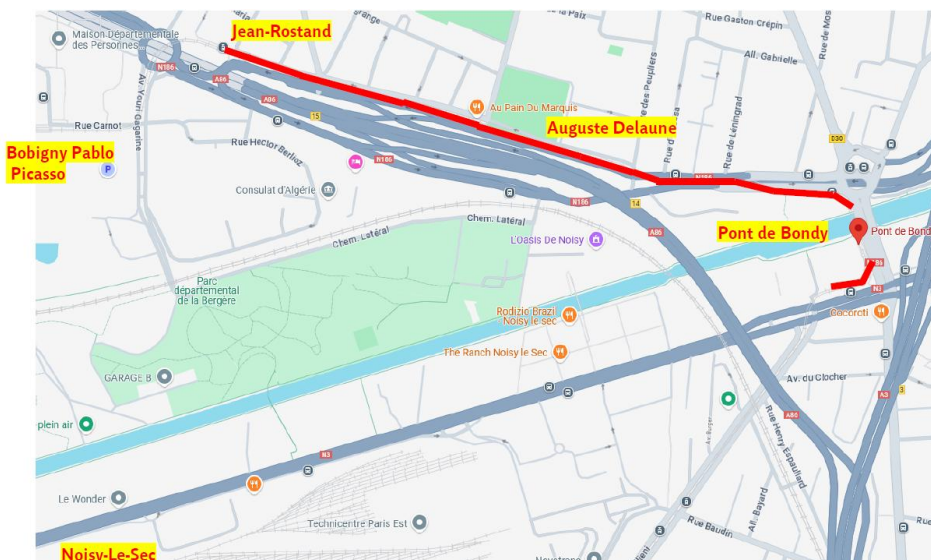



ITC pour les travaux Pôle La Courneuve 6 Routes

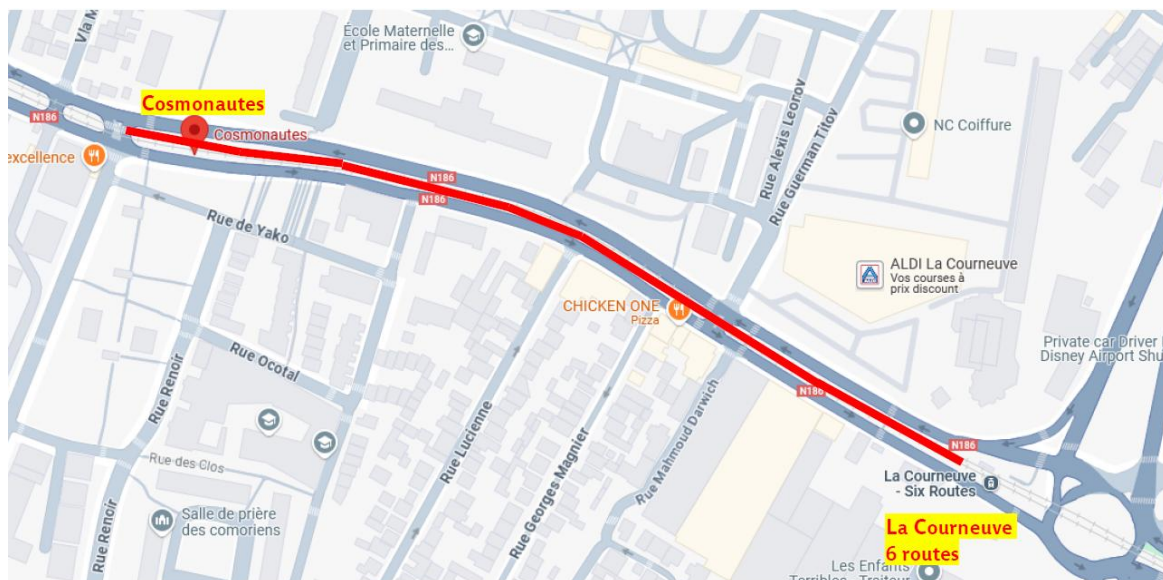

Objectifs du projet

- Réalisation des travaux du pôle La Courneuve 6 Routes liés à l'arrivée du GPEX
- Massification des travaux avec le programme global de renouvellement de rail



Nature des travaux

- Pôle La Courneuve 6 Routes
 - Adaptation des infrastructures du T1
- Maintenance : démolition et reconstruction de la plateforme de voie
 - 800 mètres linéaires de plateforme de voie
 - 2 carrefours routiers
 - + de 5100 m2 de revêtement



ITC pour renouvellement de la plateforme de voie



Objectifs du projet

- Dans le cadre du programme global de renouvellement de rail de la ligne T1, des travaux sont prévus jusqu'en 2029 sur tout le tronçon historique de la ligne.
- La coupure d'exploitation en juillet 2025 est réalisée entre Gare de St Denis et Hôpital Delafontaine



Dates et impacts

- ITC de 2 semaines : du 13/07/26 au 28/08/26
- Tronçon concerné : Gare de St Denis – Hôpital Delafontaine
- Avec brassage (passage de rames sur le tronçon coupé) matin et soir
- Bus de remplacement au plus proche des stations,



Nature des travaux

- Démolition et reconstruction de la plateforme de voie
 - 500 mètres linéaires de plateforme de voie concernés
 - Travaux :
 - Meulage – rechargement
 - Remplacement de revêtement
 - Traitement des affaissements

REX :

Déroulement dans un contexte particulier suite à un incident majeur sur le Pont de L'Île-Saint-Denis

Offre de substitution adaptée

Communication de perturbation et accompagnement (affichages, IV médias distants, Team Tram, canalisation...)



ITC pour les travaux Pont de L'Ile-Saint-Denis



Contexte

- Nuit du 15 mai 2025 : un bateau de croisière heurte une pile du Pont de L'Ile-Saint-Denis
- Décision du D93 de fermer le pont à la circulation automobile et au passage du T1 (déformations incompatibles avec l'état de service) jusqu'à nouvel ordre




Dates et impacts

- ITC depuis le 16 mai prise de service
- Bus de substitution entre Les Courtilles et Mairie de Villeneuve-la-Garenne
- Navette de L'Ile-Saint-Denis (depuis le 21 juillet)




Itinéraire de la substitution bus

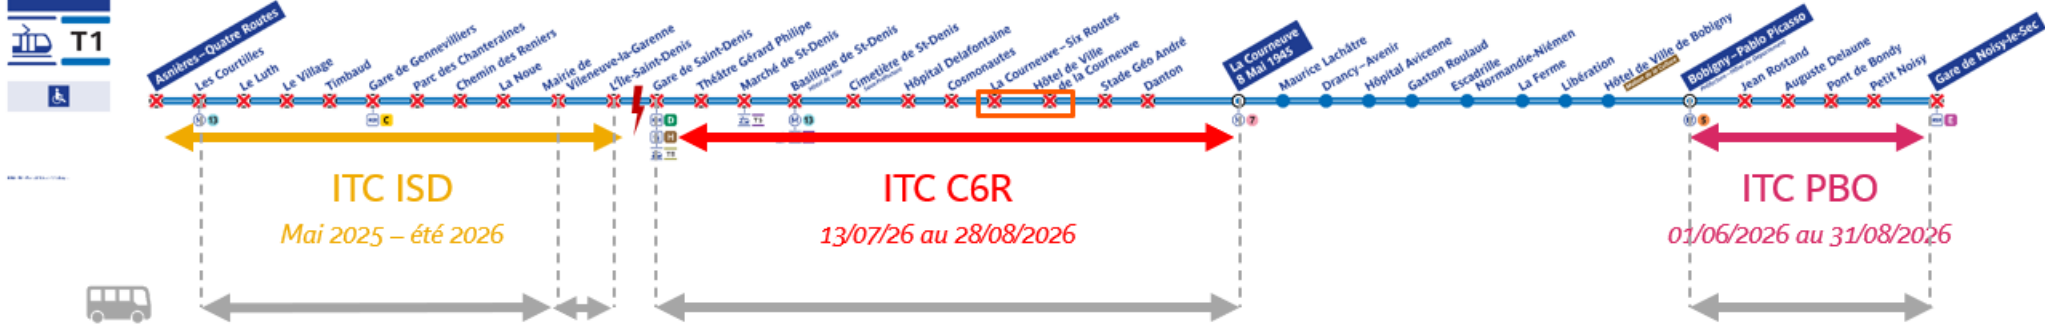

Dates et impacts

- ITC de 7 semaines, du 13 juillet au 28 août 2026
- Doublement de l'arrêt Gare de Saint-Denis : rue du Port et rue Paul Eluard (correspondances Transilien et T8)

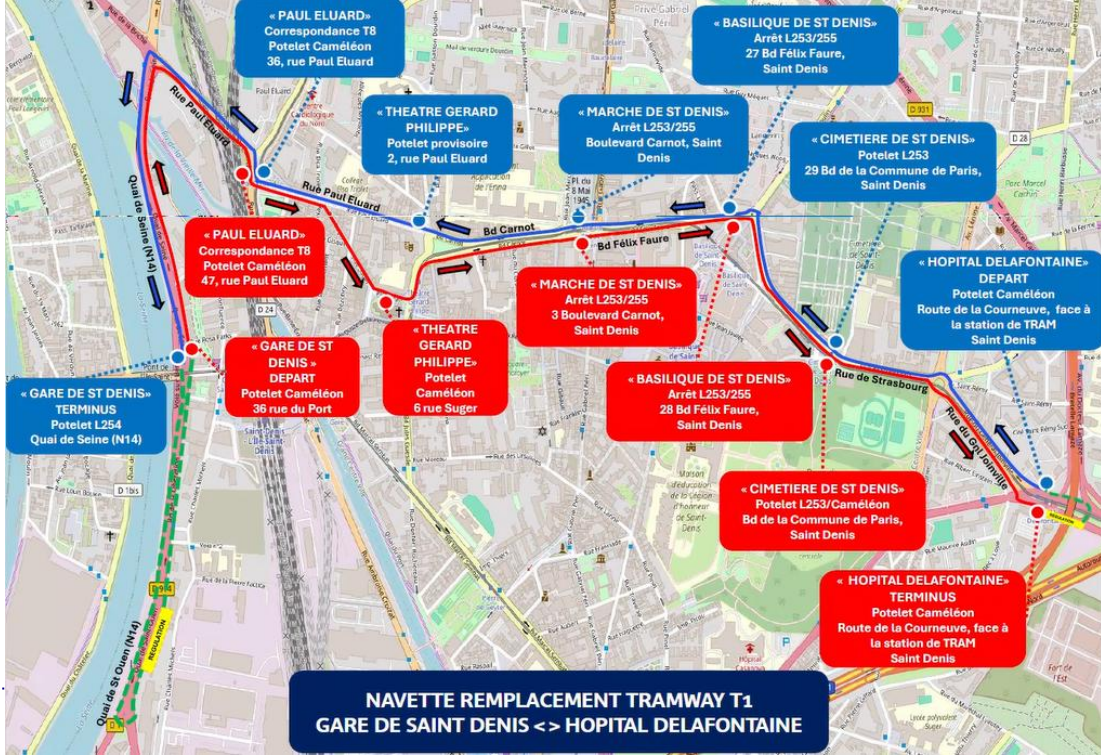




ITC pour les travaux Désaturation La Défense



Objectifs du projet

- Amélioration des conditions d'exploitation du T2
- Amélioration du confort voyageurs
- Anticiper l'augmentation des flux liés à la mise en service du RER E et de la ligne 15, mieux traiter les correspondances

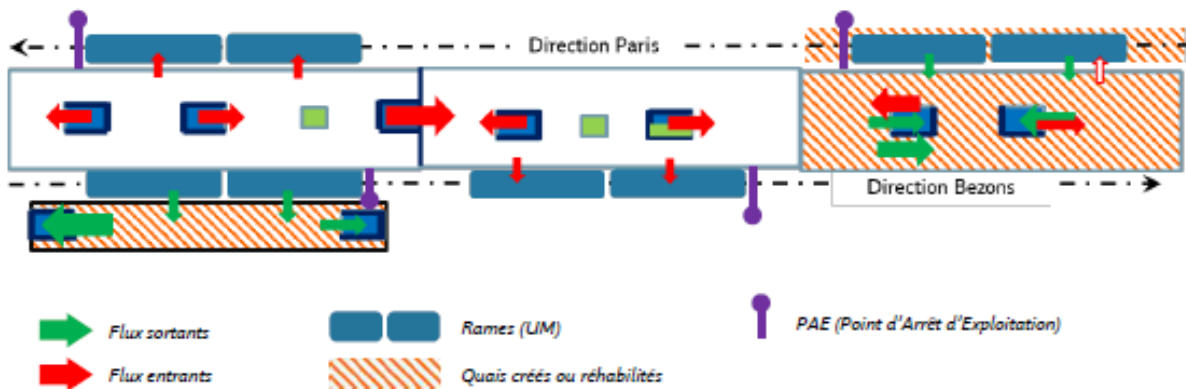

Nature des travaux

- Modification de la station pour réduire la densité de voyageurs à quai et limiter les conflits de flux :
 - Réhabilitation d'une partie non exploitée du quai dans sa partie Nord (dit « quai mort ») pour y créer un point d'arrêt en voie 2 (direction Pte de Versailles) dédiée à la descente des voyageurs,
 - Modification des accès pour tenir des 3 points d'arrêts (1 en direction de Pt de Bezons, 2 en direction de Pte de Versailles). Travaux liés au pôle GPEX du Pont de Bondy
- Massification des travaux avec le programme de renouvellement de rail



Dates et impacts

- Travaux jusqu'à T2 2027
- ITC de 6 semaines entre le 12 juillet fin de service et le 24 août 2026 prise de service
- Bus de substitution entre les stations Puteaux et Charlebourg – échange en cours avec IdFM pour l'itinéraire de sub



14 AVRIL 2026



Projets S2 2026

CONFIDENTIEL



Travaux de l'été 2026

LIGNE	ENTITE	PROJET	DEBUT	FIN	DETAIL
Ligne 2	Voie	RAV + RBT dans la zone Jaures - Stalingrad	19/10/26 lun.	25/10/26 dim.	ITC entre Barbes et père Lachaise
Ligne 4	CPMO	Réhabilitation des caissons métalliques St Michel	14/09/2026	15/11/2026	ITE sur la station Saint Michel
Ligne 12	OMF19	Installation d'équipements OCTYS	14/11/26 sam.	15/11/26 dim.	ITC de 2 jours entre Jules Joffrin et Mairie d'Aubervilliers
Ligne 13	OMF19	Automatisation - Fermeture de stations non déjà équipées de FQ pour le rehaussement des quais	24/09/2026	27/09/2026	Non desserte de la station Porte de Saint Ouen pendant 4 jours
Ligne 13	OMF19	Automatisation - Fermeture de stations non déjà équipées de FQ pour le rehaussement des quais	29/01/2026	01/11/2026	Non desserte de la station Porte de Clichy pendant 4 jours
Ligne 13	OMF19	Automatisation - Fermeture de stations non déjà équipées de FQ pour le rehaussement des quais	26/11/2026	29/11/2026	Non desserte de la station Mairie de Saint Ouen pendant 4 jours
Ligne 13	OMF19	Modernisation - Essais systèmes pour la mise en service du MF19	13/09/26 dim.	13/12/26 dim.	2 dimanches matin par mois avec coupure jusque 12h sur ligne entière
T3a	TRAM	Travaux de Renouvellement de Rail	26/10/2026	01/11/2026	ITC entre Stade Charlety et Porte d'Ivry

Merci 


de votre attention


Annexes

Renouvellement des voies entre Colonel Fabien et La Chapelle




Objectifs du projet

→ Renouvellement patrimonial des voies de la ligne 2



Nature des travaux

- Renouvellement de 195 ml de voie entre Colonel Fabien et Jaurès
- Renouvellement de 251 ml de voie entre Stalingrad et La Chapelle



Dates et impacts

- ITC entre Barbès Rochechouart et Père Lachaise
- 7 jours d'ITC du 19/10/2026 au 25/10/2026
- 3 nuits de stabilisation sous LTV 30 km/h entre Colonel Fabien et La Chapelle du 26/10/2026 au 28/10/2026

Renouvellement de l'appareil de voie 74 à Anvers



Objectifs du projet

→ Renouvellement patrimonial des voies sur la Ligne 2




Nature des travaux

→ Renouvellement de l'appareil de voie n°74



Dates et impacts

- Travaux en Nuits Courtes de S36 à S41 2026
- Mise en place d'une LTV de S36 à S41 2026. LTV à 30 km/h sur Voie 1 et Voie 2 entre Anvers et Pigalle
- Condamnation en voie directe de l'adv 74
- Condamnation du raccord 2/4/5 durant les travaux

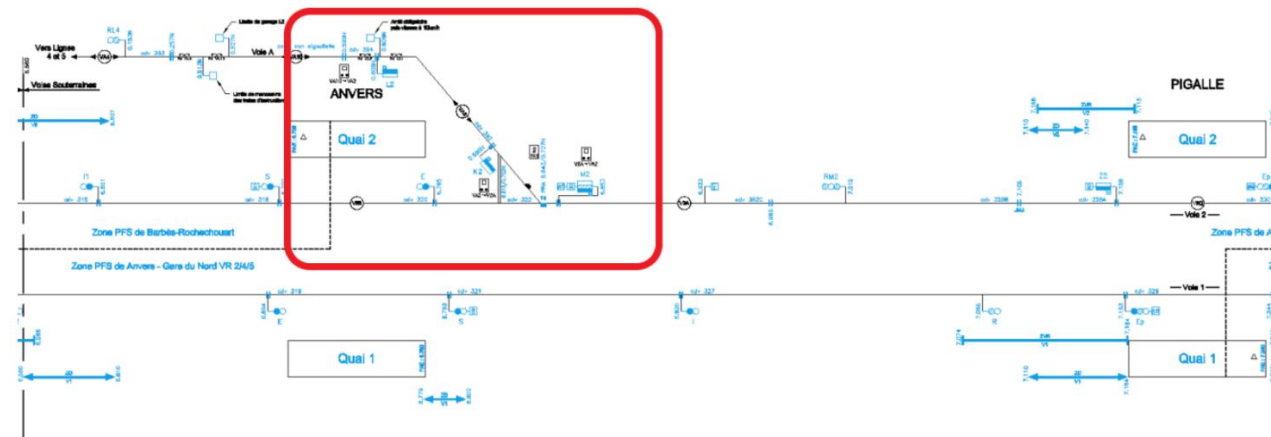

Merci⁺⁺

de votre attention
